

ZMLUVA O DIELO č. 2801/2016/PS3

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: Zmluvné strany
Adresa: Mesto Tisovec
Zastúpený: Nám. Dr.V. Clementisa 1,98061 Tisovec
Bankové spojenie: Ing. Peter Mináč, primátor mesta
Číslo účtu: VÚB pobočka Tisovec
IČO: 21828392/0200
IČ DPH: 319155
telefón: SK 2021230497
047/549323

Zhotoviteľ: (doplň zhotoviteľ)

Obchodné meno: COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
Sídlo: Kysihýbelská 29, Banská Štiavnica 969 01
Adresa: Kysihýbelská 29, Banská Štiavnica 969 01
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Gallo - konateľ
Ing. Ján Šimčík – prokurista spoločnosti
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vl.č. 2800/S
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Štiavnica
Číslo účtu: 2196246422/0200
IČO: 31631134
IČ DPH: SK 2020478229

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok dohody zmluvných strán. Zmluva taktiež upravuje a nadväzuje na dodatok č.3 k ZoD č.2503/2011/PS

Čl.I

Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác s názvom: "Tisovec – rekonštrukcia základnej školy, objekt Budova školy".
- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa priloženej vysúťaženej cenovej ponuky v rámci zákazky zadávanej podprahovým postupom zrealizuje stavebné práce, vyhotoví dielo.
- 1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenodiela.
- 1.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo:
V závislosti od finančných prostriedkov upraviť rozsah predmetu zákazky a upraviť lehotu ukončenia zmluvy.

Čl. II

Čas plnenia

- 2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
 - 2.1.1. odovzdanie staveniskado 15 dní od účinnosti zmluvy
 - 2.1.2. začatie prácdo 21 dní od odovzdania staveniska
 - 2.1.3. ukončenie prácdo 12 mesiacov od odovzdania staveniska
- 2.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 2.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - 2.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 2.2.2. v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
 - 2.2.3. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.
- 2.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 2.4. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.
- 2.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Č I. III
Zmluvná cena

- 3.1. Zmluvná cena za predmet zmluvy "Tisovec – rekonštrukcia základnej školy, objekt Budova školy" vrátane stavebných prác, je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Táto cena sa považuje za maximálne platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov kedy môže dôjsť k zmene ceny v zmysle bodu 3.3.

Zmluvná cena:

	Cena v €		
	bez DPH	DPH 20 %	s DPH
Stavebné práce	47 849,87	9 569,97	57 419,84

Slovom: päťdesiatšesťtisícštyristodevätnásť EUR, 84/100 centov

- 3.2. Cena diela je stanovená na predloženej cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky vedľajšie rozpočtové náklady - zriadenie uzávierky, dočasné DZ, územné či prevádzkové vplyvy a pod.
- 3.3. K zmene ceny môže dôjsť:

- 3.3.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
- 3.3.2. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
- 3.3.3. v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, zmenou rozsahu stavebných prác, ktorú si objednávateľ vyhradil.
- 3.3.4. v prípade poskytnutia účelových finančných prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky objednávateľovi vo výške nižšej ako je zmluvná cena uvedená v odseku 3.1 tohto článku. V tomto prípade bude zmluvná cena zúžená. Postup úpravy ceny pri zúžení je uvedený v odseku 3.5. tohto článku.

- 3.3. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

- 3.4. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (viac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Viac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10% cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

- 3.5. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

- 3.5.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti predloženej cenovej ponuke (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a stavebného dozoru,

- 3.5.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer viac
- prác, položkovite odpočet ceny menej
- prác, sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,

- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ⁰⁰) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,

- 3.5.3. pre ocenenie výkazu výmer u viac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
- c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených firmou CENEKON, ODIS na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,
- d) menej prác budú odpočítavané podľa rozpočtu,
- e) ceny viac prác, resp. menej prác budú adekvátne korigované o cenovú zložku za finančné služby.

Čl. IV. Platobné podmienky a fakturácia

4.1. Platobné podmienky

- 4.1.1. Dňom odovzdania diela je deň, keď bude odovzdaný posledný objekt stavby.
- 4.1.2. Podkladom pre fakturáciu budú doklady o prevzatí uskutočneného plnenia podpísané povereným zástupcom objednávateľa alebo ním poverenou osobou.

4.2. Fakturácia

- 4.2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu diela s DPH v EUR uhradí objednávateľ po vystavení faktúry. Faktúry môžu byť predkladané aj priebežne samostatne po vykonaní jednotlivých ocenených výkonov podľa cenovej ponuky a prevzatí vykonaných prác podľa bodu 4.1.2 ..
- 4.2.2. Objávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na realizované práce.

Čl. V. Dodacie podmienky

5.1. Odovzdanie staveniska:

- 5.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
- 5.1.2. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č.237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,
- 5.1.3. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

5.2. Realizácia:

- 5.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
- 5.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 5.2.3. zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska, 5.2.4. zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,
- 5.2.5. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 5.2.6. pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 5.2.7. po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 2 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva.
- 5.2.8. zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 5.2.9. objednávateľ, alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na stavenisko, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako

aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,

- 5.2.10 stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je povinný:

- 5.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
- 5.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
- 5.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- 5.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- 5.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,

- 5.2.11. zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto

odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,

5.2.12.ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávatel'. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávatel' pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,

5.2.13.objednávatel' bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby,

5.2.14.materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľ'om musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ' na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohoto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ'. Objednávatel' môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. Objednávatel' má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľ'om právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou,

5.2.15.zhotoviteľ' musí bez meškania a písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania,

5.2.16.zhotoviteľ' je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávatel'a a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,

5.2.17.žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ' je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ' aspoň 2 pracovný deň vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ',

5.2.1 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľ'ovi v stavebnom denníku.

5.3. Stavebný denník:

5.3.1. zhotoviteľ' je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor,

5.3.2. do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,

5.3.3. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam generálny projektant, stavebný dozor objednávatel'a, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,

5.3.4. denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,

5.3.5. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľ'ovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,

5.3.6. pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľ'a alebo jeho podzhotoviteľ'ov, vykoná zhotoviteľ' nariadené práce na svoje vlastné náklady,

5.3.7. ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,

5.3.8. ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

5.4. Odovzdanie:

5.4.1. dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,

5.4.2. dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách,

5.4.3. prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávatel'a,

5.4.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia,

5.4.5. zhotoviteľ' je povinný najneskôr 3 dni vopred oznámiť objednávatel'ovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie,

5.4.6. zhotoviteľ' je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela,

5.4.7. zhotoviteľ' je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávatel'ovi kompletnú dokumentáciu kvality:

- preukazné skúšky zabudovaných materiálov s uvedením názvu stavby
- potvrdené a podpísané originály zápisníc a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- stavebné denníky.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania,

5.4.8. objednávatel' je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľ'a sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na CD nosiči (prípadne inom médiu), ak mu tak boli poskytnuté

5.4.9. objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť stavby, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť stavby, ktorá podľa dojednaní mala byť už dokončená,
5.4.10. zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,
5.4.11. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
5.4.12. zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzдание a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii. 5.5. Osobitné technické podmienky:

- 5.5.1. Dielo bude zhotovené z materiálov vyhovujúcich podmienkam STN EN. Pre použité materiály bude predložené vyhlásenie zhody výrobcov v zmysle platných STN EN.
5.5.2. Kvalita použitých materiálov sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN a kvality vykonávaných stavebných prác certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA.
5.5.3. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. a zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim správcom a užívateľom) písomnou formou.
5.5.4. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,
5.5.5. Nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Čl. VI.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 6.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
6.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
6.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ. 6.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom, alebo vadou realizovaného postupu, dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
6.5. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať požadované vlastnosti v zmysle čl. IV. Dodacie podmienky, po dobu minimálne 36 mesiacov.
6.6. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

Čl. VII.

Zmluvné pokuty

- 7.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bodu 2.1 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z ceny predmetnej časti za každý deň omeškania.
7.2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 4.2 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
7.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Čl. VIII.

Riešenie sporov

- 8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
8.1.1. zmluva o dielo,
8.1.2. súťažné podklady,
8.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),
8.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
8.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
8.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
8.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.

Čl. IX.
Ostatné práva a povinnosti

- 9.1. Všetky zmluvné dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 9.2. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. X.
Odstúpenie od zmluvy

- 10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka.
Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané služby.
- 10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak máme uplynúť dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 10.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 10.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 10.6. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

- 11.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
- 11.2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.
- 11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 11.4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 11.5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 11.6. Táto zmluva sa stáva platnou dohodou strán o celom jej obsahu a účinnou sa zmluva stáva prvým dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 11.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha: - odpočty
 - prípočty
 - výsledný rozpočet

V Banskej Štiavnici, dňa: 28.01.2016

V Tisovci, dňa: 28.01.2016

Zhotoviteľ

COMBIN
Banská Štiavnica s.r.o.
Kysibýčelská 29
969 01 Banská Štiavnica
stavebná výhoda

Objednávateľ


MESTO TISOVEC
PRIMÁTOR

ODPOČTY

Stavba : Tisovec - rekonštrukcia základnej školy		Miesto: Tisovec		Rozpočet:	
Objekt : Budova školy		JKSO :		Spracoval:	
				Dňa: Zmluva č.:	
Odberteľ:				IČO:	
Dodávateľ:				IČO:	
Projektant:				IČO:	
1 M3 OP		1 M2 UP			
1 M2 ZP		1 M			
A	ZRN	konštrukcie a práce	spolu ZRN	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	-24 628,27	-24 628,27	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:			12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:			13	Sťažené podmienky
4	iné:			14	
5	Súčet:	-24 628,27	-24 628,27	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár				D	
dátum:				ON - ostatné náklady	
pečiatka:				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
				17 Inžinierska činnosť	
				18 Projektové práce	
				19	
				20	
				Súčet riadkov 16 až 19:	
odberateľ, obstarávateľ				E	
dátum:				Celkové náklady	
pečiatka:				21	
				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
				22 DPH 20% z:	
				-4 925,65	
				23 DPH 0% z:	
				24	
				Súčet riadkov 21 až 23:	
				-29 553,92	
				F	
				Odpočet - prípočet	

Stavba : Tisovec - rekonštrukcia základnej školy
Objekt : Budova školy

ODPOČTY

Názov objektu	Cena celkom
Átrium, zateplenie murivo, plochá strecha a výmena okien v triedach átria	-1 342,51
Šikmá strecha, murovanie vnútorného štítu a odstránenie atiky	-8 594,11
Vonkajšie zateplenie budovy školy a výmena okien	-14 691,66

CELKOM	-24 628,27
---------------	-------------------



COMBIN
Banská Štiavnica s.r.o.
Kydárčická 29, 10
969 01 Banská Štiavnica
stavebná výroba

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Tisovec - rekonštrukcia základnej školy

Objekt : Budova školy

Časť : Átrium, zateplenie murívo, plochá strecha a výmena okien v triedach átria-kapitálové výdavky

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	011	31123-1411	Murívo nosné z tehál POROTHERM 38 domurovanie medzi oknami		-6,090 m3		162,90	-992,06		-992,06
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :										
					-992,06			-992,06		-992,06
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
3	014	61242-5921	Omrätka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná hladká		-15,100 m2		19,76	-298,38		-298,38
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :										
					-298,38			-298,38		-298,38
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
11	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m		-0,612 t		25,51	-15,61		-15,61
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :										
					-15,61			-15,61		-15,61
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :										
					-1 306,05			-1 306,05		-1 306,05
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
784 - Maľby										
22	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojvrásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m		-15,190 m2		2,40	-36,46		-36,46
784 - Maľby spolu :										
					-36,46			-36,46		-36,46
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :										
					-36,46			-36,46		-36,46
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :										
					-36,46			-36,46		-36,46
Rozpočet celkom :										
					-1 342,51			-1 342,51		-1 342,51



COMBIN
Banská Štiavnica s.r.o.
Kynčelská 29, 10
969 01 Banská Štiavnica
stavebné výroba

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Tisovec - rekonštrukcia základnej školy
Objekt : Budova školy
Časť : Šikmá strecha, murovanie vnútorného štítu a odstránenie atiky
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
2	011	31123-1422	Murovo nosné z tehál POROTHERM 38 vnútorné štíty		-0,963 m3		162,90	-156,87		-156,87
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :										
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :										
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
19	783	R2 -	Prestupy cez strechu		-1,000 kpl		1 200,00	-1 200,00		-1 200,00
762 - Konštrukcie tesárske										
20	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2		-809,300 m		7,10	-5 746,03		-5 746,03
24	762	76242-1110	Montáž obloženia stropov hobrou, hrúbka do 12 mm		-955,900 m2		1,56	-1 491,20		-1 491,20
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :										
Rozpočet celkom :										
-8 437,23										
-8 594,11										



COMBIN
Banská Štiavnica s.r.o.
Kyslíkova 29.
969 01 Banská Štiavnica
stavebné výmery

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Tisovec - rekonštrukcia základnej škôl
Objekt : Budova škôl
Časť : Vonkajšie zateplenie budovy školy a výmena okien
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1	011	31123-1411	Muriwo nosné z tehál POROTHERM 38 domurovanie medzi oknami	-25,390 m3		162,90	-4 136,03		-4 136,03
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	-4 136,03			-4 136,03		-4 136,03
2	014	61242-5921	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná hladká	-194,220 m2		19,76	-3 837,79		-3 837,79
4	011	62599-1207	Zatepl. vonk. stien omietka akrylová a polystyrén hr.100 mm	-128,420 m2		32,14	-4 127,42		-4 127,42
5	011	62342-1432	Omietka vonkajších stien hrubá zatretá (vysprávky)	-179,385 m2		11,44	-2 052,16		-2 052,16
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	-10 017,37			-10 017,37		-10 017,37
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	-14 153,40			-14 153,40		-14 153,40
			PRÁCE A DODÁVKY PSV						
			76 - KONŠTRUKCIE						
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
15	767	76763-4101	Montáž dverí	-1,000 ks		93,60	-93,60		-93,60
16	MAT	552 9629534	Dodávka vonkajších dverí	-1,000 kus		444,66		-444,66	-444,66
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	-538,26			-93,60	-444,66	-538,26
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	-538,26			-93,60	-444,66	-538,26
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	-538,26			-93,60	-444,66	-538,26
			Rozpočet celkom :	-14 691,66			-14 247,00	-444,66	-14 691,66



COMBIN
Banská Štiavnica s.r.o.
Kysťová 29, 271 01 Banská Štiavnica
IČO: 36068788

Stavba : Tisovec - rekonštrukcia základnej školy
Objekt : Budova školy

PRIPOČTY

Názov objektu	Cena celkom
Átrium, zateplenie murivo, plochá strecha a výmena okien v triedach átria	780,43
Šikmá strecha, murovanie vnútorného štítu a odstránenie atiky	33 467,40
Vonkajšie zateplenie budovy školy a výmena okien	38 230,32
CELKOM	72 478,15



COMBIN
Banská Štiavnica a.s.
Kysťácká 29, 14
969 01 Banská Štiavnica
stavebná výročka

Spracovali:
JKSO :
Dátum:

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba : Tisovec - rekonštrukcia základnej školy

Objekt : Budova školy

Časť : Átrium, zateplenie murívo, plochá strecha a výmena okien v triedach átria-kapitálové výdavky

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

6 011 62599-1202

Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi akrylátová a polystyrén hr. 50 mm

28,872 m2 27,11

780,43

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Rozpočet celkom :

780,43

780,43

780,43

780,43

780,43

780,43



COMBIN
Banská Štiavnica s.r.o.
Kynýbocká 29. 14
960 01 Banská Štiavnica
stavbár výstav

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Tisovec - rekonštrukcia základnej školy
Objekt : Budova školy
Časť : Šikmá strecha, murovanie vnútorného štítu a odstránenie atiky
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
3	011	31135-1105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	32,650 m2		13,38	436,86		436,86
4	011	31135-1106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	32,650 m2		4,60	150,19		150,19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				587,05			587,05		587,05
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
5	011	41732-1414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	15,998 m3		157,10	2 513,29		2 513,29
6	011	41736-1621	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10338	1,262 t		2 250,79	2 840,50		2 840,50
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				5 353,78			5 353,78		5 353,78
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
7	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	28,720 m2		1,92	55,14		55,14
8	003	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	28,720 m2		1,38	39,63		39,63
9	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	28,720 m2		1,22	35,04		35,04
18	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	50,979 t		25,51	1 300,47		1 300,47
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				1 430,29			1 430,29		1 430,29
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				7 371,12			7 371,12		7 371,12
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
19	783	R2 -	Prestupy cez strechu	1,000 kpl		3 325,00	3 325,00		3 325,00
76 - KONŠTRUKCIE									
762 - Konštrukcie tesárske									
			Montáž krovov viazaných priezrez. Plocha do 120 cm2	20,400 m		6,50	132,60		132,60
			Montáž krovov viazaných priezrez. plocha nad 224 do 288 cm2	969,540 m		9,13	8 851,90		8 851,90
			Montáž krovov viazaných priezrez. plocha nad 288 do 450 cm2	111,120 m		15,40	1 711,25		1 711,25
			Foša SM omietaná 3 75 125-190	4,030 m3		294,85	1 188,25		1 188,25



Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, řemesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Memá jednotka	Jednotková cena	Konstruktce a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
27	MAT	605 337130	Hranoly SM/JD akost' A 400-650x100x120-140	11,500 m3		315,25		3 625,38	3 625,38
29	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	17,780 m3		40,33	717,07		717,07
			762 - Konštrukcie tesárske spolu :	16 226,44			11 412,82	4 813,62	16 226,44
			766 - Konštrukcie stolárske						
35	700	766.1-11	Obklad stien íatranským profilom hr. 16mm podobite strechy a zakrytie vnútorných štítov	105,004 m2		45,59	4 787,13		4 787,13
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	4 787,13			4 787,13		4 787,13
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	21 013,57			16 199,95	4 813,62	21 013,57
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
			783 - Nátery						
38	783	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	292,686 m2		3,03	886,84		886,84
39	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Laslanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	159,500 m2		5,46	870,87		870,87
			783 - Nátery spolu :	1 757,71			1 757,71		1 757,71
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 757,71			1 757,71		1 757,71
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	26 096,28			21 282,66	4 813,62	26 096,28
			Rozpočet celkom :	33 467,40			28 653,78	4 813,62	33 467,40



COMBINA
Banská Štiavnica, s.r.o.
Kysuckého nárožia
969 01 Banská Štiavnica
stavebné úrad

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Tisovec - rekonštrukcia základnej školy
Objekt : Budova školy
Časť : Vonkajšie zateplenie budovy školy a výmena okien
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
6	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	28,720 m2		1,92	55,14		55,14
7	003	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	57,440 m2		2,52	144,75		144,75
8	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	28,720 m2		0,94	27,00		27,00
9	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	32,506 t		25,51	829,23		829,23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				1 056,12			1 056,12		1 056,12
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				1 056,12			1 056,12		1 056,12
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
76 - KONŠTRUKCIE									
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
10	767	76763-1800	Demontáž dverí a okien a rámov do 4m2	379,455 m2		6,48	2 458,87		2 458,87
11	767	76763-2223	Montáž okien s páskou a vyplnením penou	220,640 m2		38,98	8 600,55		8 600,55
12	767	76763-32134	Montáž parapetov vonkajších a vnútorných	191,800 m		1,66	318,39		318,39
13	MAT	552 962233	Dodávka okien	220,640 m2		109,62		24 186,56	24 186,56
14	MAT	552 962961	Dodávka parapetov vonkajších a vnútorných	191,800 m		7,94		1 522,89	1 522,89
17	767	76785-1802	Demontáž parapetov	102,300 m		0,85	86,96		86,96
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				37 174,21			11 464,76	25 709,45	37 174,21
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				37 174,21			11 464,76	25 709,45	37 174,21
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				37 174,21			11 464,76	25 709,45	37 174,21
Rozpočet celkom :				38 230,32			12 520,87	25 709,45	38 230,32



COMBIN
Banská Štiavnica s.r.o.
Kysáňská 29, 06
969 01 Banská Štiavnica
stavebná výroba

4

COMB IN
Beski Slavica s.r.o.
Kynčlebská 29, ②
366 01 Kynčlebská Slavice
366 01 Kynčlebská Slavice
Kynčlebská 29, ②

Stavba : Tisovec - rekonštrukcia základnej školy
Objekt : Budova školy

Názov objektu	Cena celkom
Atrium. Zateplenie murivo, plochá strecha a výmena okien v triedach atria	21 421,97
Šikmá strecha, murovanie vnútorného štítu a odstránenie atiky	130 907,11
Vnútorné opravy zatečených tried pri átriu	26 945,92
Vonkajšie zateplenie budovy školy a výmena okien	116 650,59
CELKOM	295 925,59




COMBIR
Banka Slavnica a.s.
Kysáčská 29, 0
969 01 Banka Slavnica
stavebná výroba

Stavba : Tisovec - rekonštrukcia školy

Objekt : Budova školy

Časť : Átrium, zateplenie murívo, plochá strecha a výmena okien v triedach átria

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	011	31123-1411	Murívo nosné z tehál POROTHERM 38 domurovanie medzi oknami	1,260 m3		162,90	205,25		205,25
2	011	31123-2504	Stavebné úpravy svetlíkov	1,000 kpl		4 800,00	4 800,00		4 800,00
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	5 005,25			5 005,25		5 005,25
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
3	014	61242-5921	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná hladká	14,400 m2		19,76	284,54		284,54
4	011	62342-1121	Omietka rovná vápenná hrubá zatretá	57,000 m2		11,40	649,80		649,80
5	011	62525-4305	Zateplovací systém hr. 50 mm pod parapet + utiesnenie dilatčných škár pod foliou strechy	35,820 m2		37,44	1 341,10		1 341,10
6	011	62599-1202	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí akrylátová a polystyrén hr. 50 mm	99,222 m2		27,11	2 689,91		2 689,91
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	4 965,35			4 965,35		4 965,35
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
7	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	156,000 m2		1,92	299,52		299,52
8	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	312,000 m2		2,52	786,24		786,24
9	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	156,000 m2		0,94	146,64		146,64
10	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	47,500 m2		5,60	266,00		266,00
11	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	9,720 t		25,51	247,96		247,96
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 746,36			1 746,36		1 746,36
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	11 716,96			11 716,96		11 716,96

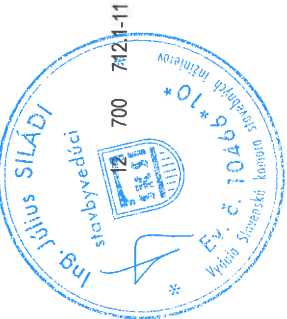

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

712 - Povalkové krytiny

Povalková krytina stiech do 10° 1xpxc 1x separačná geotext 2x

700 7121-11

76,540 m2

39,59

3 030,22

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
712 - Pevňacie krytiny spolu :				3 030,22			3 030,22		3 030,22
71 - IZOLÁCIE spolu :				3 030,22			3 030,22		3 030,22
76 - KONŠTRUKCIE									
763 - Konštrukcie - drevestavby									
13	763	76313-3012	Podhlady sadr zaveseny 2x profil UD a CD dosky RB hr. 15 mm	31,509 m2		25,36	799,07		799,07
763 - Konštrukcie - drevestavby spolu :				799,07			799,07		799,07
766 - Konštrukcie stolárske									
14	766	76662-1832	Demontáž okien a rámov do 4m2	47,000 m2		7,78	365,66		365,66
766 - Konštrukcie stolárske spolu :				365,66			365,66		365,66
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
15	767	76723-3110	Dodávka a montáž rebríka	1,000 kus		516,96	516,96		516,96
16	767	76731-1821	Demontáž svetlíkov strešných bodových cez 1 do 1,5 m2	8,000 kus		10,20	81,60		81,60
17	767	76731-6311	Montáž svetlíkov strešných bodových cez 1 do 1,5 m2	4,000 kus		180,00	720,00		720,00
18	MAT	553 4B0101	Svetlovod	4,000 kus		959,76	3 839,04		3 839,04
19	767	76763-3210	Montáž parapetov	22,000 m		1,66	36,52		36,52
20	767	76785-1802	Demontáž parapetov	22,000 m		0,85	18,70		18,70
21	MAT	552 962960	Dodávka parapetov vonkajších a vnútorných	22,000 m		11,94	262,68		262,68
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				5 475,50			1 373,78		5 475,50
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				6 640,23			2 538,51		6 640,23
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
784 - Maľby									
22	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do 3,8m	14,400 m2		2,40	34,56		34,56
784 - Maľby spolu :				34,56			34,56		34,56
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				34,56			34,56		34,56
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				9 705,01			5 603,29		9 705,01
Rozpočet celkom :				21 421,97			17 320,25		21 421,97




Stavba : Tisovec - rekonštrukcia školy

Objekt : Budova školy


Časť : Šikmá strecha, murovanie vnútorného štítu a odstránenie atíky

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1	016	R2 -	Dodávka a montáž bleskozvodu	1,000	kpl	4 000,00	4 000,00		4 000,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
2	011	31123-1400	Murovo nosné z tehál POROTHERM 38 P8 MVC 2,5	20,629	m3	162,90	3 360,46		3 360,46
3	011	31135-1105	Debenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	42,600	m2	13,38	569,99		569,99
4	011	31135-1106	Debenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	42,600	m2	4,60	195,96		195,96
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :									
				4 126,41			4 126,41		4 126,41
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
5	011	41732-1414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	20,874	m3	157,10	3 279,31		3 279,31
6	011	41736-1621	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10338	1,646	t	2 250,79	3 704,80		3 704,80
				6 984,11			6 984,11		6 984,11
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :									
				1 005,960	m2	1,92	1 931,44		1 931,44
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
7	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	1 005,960	m2	1,38	1 388,22		1 388,22
8	003	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	1 005,960	m2	1,22	1 227,27		1 227,27
9	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	27,060	m3	27,79	752,00		752,00
10	013	96203-2254	Búranie muríva z tehál cem. na MC alebo otvorov nad 4 m2	54,120	t	10,01	541,74		541,74
11	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	54,120	t	11,44	619,13		619,13
12	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	54,120	t	11,94	646,19		646,19
13	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 353,000	t	0,37	500,61		500,61
14	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	54,120	t	10,01	541,74		541,74
15	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	1 080,000	t	1,14	1 231,20		1 231,20
16	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	54,120	t	4,14	224,06		224,06
17	013	97910-1737	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. odpadu na urč.skld.	54,120	t	79,20	4 286,30		4 286,30



OMI s.r.o.
 Kysibýľská 29, 19
 Banská Štiavnica
 969 01 Banská Štiavnica
 stavebná výrava

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Memná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce	Specifikovaný materiál	Spolu
18	014	99928-1111	Presun hmot pre opravy v objektoch výšky do 25 m		116,719 t		25,51	2 977,50		2 977,50
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		16 325,66			16 325,66		16 325,66
			PRÁCE A DODÁVKY PSV		31 436,18			31 436,18		31 436,18
19	783	R2 -	Prestupy cez strechu		1,000 kpl		3 325,00	3 325,00		3 325,00
			76 - KONŠTRUKCIE							
			762 - Konštrukcie tesárske							
20	762	76233-2120	Montáž krovnov viazaných prierez. Plocha do 120 cm2		20,400 m		6,50	132,60		132,60
20	762	76233-2120	Montáž krovnov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2		330,700 m		7,10	2 347,97		2 347,97
21	762	76233-2130	Montáž krovnov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2		1 317,540 m		9,13	12 029,14		12 029,14
21	762	76233-2140	Montáž krovnov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2		111,120 m		15,40	1 711,25		1 711,25
22	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2		955,900 m2		2,95	2 819,91		2 819,91
23	762	76234-2211	Montáž latovania do 60° rozpätie do 150 mm		955,900 m2		1,56	1 491,20		1 491,20
25	MAT	605 131400	Fošňa SM ornietaná 3 75 125-190		31,330 m3		294,85	9 237,65		9 237,65
26	MAT	605 171800	Lata podkladná 60/40 mm		9,600 m3		315,25	3 026,40		3 026,40
27	MAT	605 337130	Hranoly SM/JD akost A 400-650x100x120-140		42,370 m3		315,25	13 357,14		13 357,14
28	762	76281-1210	Montáž záklopy z dosiek hrubých, vrchný na zraz		955,900 m2		4,29	4 100,81		4 100,81
29	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov		85,550 m3		40,33	3 450,23		3 450,23
			762 - Konštrukcie tesárske spolu :		53 704,30			28 083,11	25 621,19	53 704,30
			764 - Konštrukcie kľampiarske							
30	764	76431-1111	Krytiny z poplast plechu hr 0.5mm		955,900 m		23,12	22 100,41		22 100,41
31	764	76432-3220	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 250		37,200 m		19,50	725,40		725,40
32	764	76432-32R	Okapný plech r.s. 200mm		129,200 m		7,80	1 007,76		1 007,76
33	764	76435-2315	Montáž PZ žlabové hrdlo HRD150 d-150		129,200 m		22,39	2 892,79		2 892,79
34	764	76445-4212	Montáž PZ pl. rúny odpadové kruhové ZR d-100		64,000 m		24,54	1 570,56		1 570,56
			764 - Konštrukcie kľampiarske spolu :		28 296,92			28 296,92		28 296,92
			766 - Konštrukcie stolárske							
35	700	766-1-11	Obklad stien tatranským profilom hr. 16mm podbitie strechy a zakrytie vnútorných štítov		105,004 m2		45,59	4 787,13		4 787,13
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :		103,360 m2		10,39	1 073,91		1 073,91
			Obloženie palubové smrek hr. 12mm š. 61-80mm		124,030 m2		16,87	2 092,39		2 092,39
			Paropriepustná fólia		1 150,500 m2		2,77	3 186,89		3 186,89
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :		11 140,32			5 861,04	5 279,28	11 140,32



Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
76 - KONŠTRUKCIE spolu :									
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
783 - Nátery									
39	783	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	416,716 m2		3,03	1 262,65		1 262,65
40	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lasianoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	319,000 m2		5,46	1 741,74		1 741,74
783 - Nátery spolu :				3 004,39			3 004,39		3 004,39
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				3 004,39			3 004,39		3 004,39
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				99 470,93			68 570,46	30 900,47	99 470,93
Rozpočet celkom :				130 907,11			100 006,64	30 900,47	130 907,11
							62 241,07	30 900,47	93 141,54



COMBI
 Banská Štiavnica s.r.o.
 Kynčelská 29.
 969 01 Banská Štiavnica
 stavebná kampa

Stavba : Tisovec - rekonštrukcia základnej školy

Objekt : Budova školy

Časť : Vnútročné opravy zatečených tŕied pri átriu

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1	017	R1 -	Demontáž svietidiel	1,000 kpl		655,20	655,20		655,20
2	017	R2 -	Montáž svietidiel	1,000 kpl		2 230,56	2 230,56		2 230,56
3	MAT	920 AN25436	Dodávka svietidiel pre učebne a chodbu	1,000 kpl		5 700,00		5 700,00	5 700,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
4	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	473,000 m2		2,63	1 243,99		1 243,99
5	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,720 t		25,51	69,39		69,39
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				1 313,38			1 313,38		1 313,38
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				9 899,14			4 199,14	5 700,00	9 899,14

PRÁCE A DODÁVKY PSV

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

Nátery omietok proti plesniam

783 - Nátery spolu :

6	783	78385-1217		1 924,017 m2		4,20	8 080,87		8 080,87
				8 080,87			8 080,87		8 080,87

784 - Maľby

Odstř malieb v miestnostach v do 3,8 m chemicky s oškrabáním

7	784	78440-4801		1 924,017 m2		1,98	3 809,55		3 809,55
---	-----	------------	--	--------------	--	------	----------	--	----------

Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m

8	784	78441-1301		1 924,017 m2		0,28	538,72		538,72
---	-----	------------	--	--------------	--	------	--------	--	--------

Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m

9	784	78442-2271		1 924,017 m2		2,40	4 617,64		4 617,64
---	-----	------------	--	--------------	--	------	----------	--	----------


784 - Maľby spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :

8 965,91	8 965,91	8 965,91
17 046,78	17 046,78	17 046,78
17 046,78	17 046,78	17 046,78
26 945,92	21 245,92	26 945,92



COMBIN
 Banská Štiavnica s.r.o.
 Kynársky 29.
 969 01 Banská Štiavnica
 stavebná firma

Stavba : Tisovec - rekonštrukcia školy

Objekt : Budova školy

Časť : Vonkajšie zateplenie budovy školy a výmena okien

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

Murovo nosné z tehál POROTHERM 38 domurovanie medzi oknami

3 526,79

21,650 m3

162,90

3 526,79

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

Omlietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná hladká

1 998,33

101,130 m2

19,76

1 998,33

Omlietka váp. cementová

1 664,52

145,500 m2

11,44

1 664,52

Zatepl. vonk. stien omlietka akrylová a polystyrén hr.100 mm

19 174,08

596,580 m2

32,14

19 174,08

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

22 836,93

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m

1 931,44

1 005,960 m2

1,92

1 931,44

Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041

5 070,04

2 011,920 m2

2,52

5 070,04

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m

945,60

1 005,960 m2

0,94

945,60

Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m

1 239,81

48,601 t

25,51

1 239,81

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

9 186,89

9 186,89

35 550,61

35 550,61

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

Demontáž dverí a okien a rámov do 4m2

4 084,83

630,375 m2

6,48

4 084,83

Montáž okien s páskou a vyplnením penou

18 381,41

471,560 m2

38,98

18 381,41

Montáž parapetov vonkajších a vnútorných

702,84

423,400 m

1,66

702,84

Dodávka okien

51 692,41

471,560 m2

109,62

51 692,41

Dodávka parapetov vonkajších a vnútorných

3 361,80

423,400 m

7,94

3 361,80

Montáž dverí

468,00

5,000 ks

93,60

468,00



Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
15	MAT	552 9629534	Dodávka vonkajších dverí	5,000 kus		444,66		2 223,30	2 223,30
16	767	76785-1802	Demontáž parapetov	218,100 m		0,85	185,39		185,39
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	81 099,98			23 822,47	57 277,51	81 099,98
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	81 099,98			23 822,47	57 277,51	81 099,98
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	81 099,98			23 822,47	57 277,51	81 099,98
			Rozpočet celkom :	116 650,59			59 373,08	57 277,51	116 650,59

